




N-D-111-27

PRUEBA DE BOMBEO

0 20 40 60 80 100 110 0 (l/seg.)

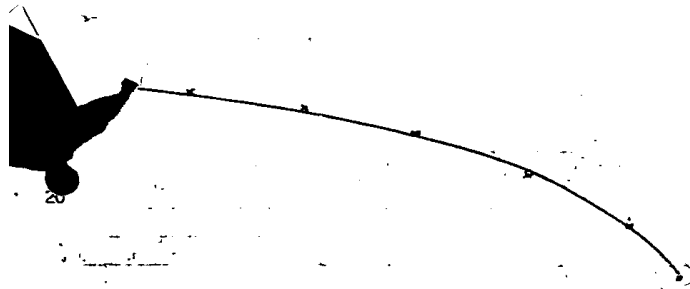

20

30

40

50

Obra: FUNDO LAS TRANQUERAS COPIAPO

Pozo: CAPTAGUA Nº 2570 SR. EMILIO SILVA

Ubicación
Ranuras



DATOS DE LA PRUEBA				
ESTABILIZACIONES				
Nº	NIVEL	Depresión	GASTO	Gasto Específico
0	9,05	-	N.E.	-
1	9,49	0,44	10	22,72
2	9,96	0,91	20	21,91
3	11,17	2,14	40	18,86
4	13,40	4,35	60	13,79
5	17,10	8,05	80	9,93
6	21,50	12,45	100	8,03
7	26,00	16,95	105	6,19
8				
9				
10				
Gastos de Explotación Estimados				
1	13,40	4,35	60	13,79
2	17,10	8,05	80	9,93
Nivel de Referencia				
Hora iniciación	28.04.88			8,00
Hora término	29.04.88			3,00
Duración				24 Hrs.

DATOS SONDAJE		
Profundidad fondo perforación	60	Mts.
Prof. fondo final sondaje	60	Mts.
Diámetro interior: 12" e = 6,35 mm.		
Ranuración : 18 - 21 ; 27 - 39		
42 - 44 ; 46- 58		
Abertura de las ranuras	2	mm.
Porcentaje de huecos	5	%

Fecha de la Prueba: 28 y 29 Abril de 1988

CAPTAGUA S.A. SIDERURGIA S.A. SIDERURGIA S.A.

JORGE CARRASCO MATURANA
Dpto. Mantención
